AGROEXPORT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

"PLANTILLA PROYECTO CIA"

Lázaro Cárdenas No. 69
Col. Jucutacato C.P. 60230
URUAPAN, MICH. MEX

Fecha de Emisión:	Ultima Revisión:	Núm. De Revisión:	Producto:	Página.
08-abr-21	08-abr-21	00	Aguacate, var. Hass	1 de 3

NOMBRE DEL PROYECTO	INICIO DEL PROYECTO	FIN DEL PROYECTO
"MODELO ÚNICO DE ESTIMACIÓN"	01/02/2022	30/09/2022
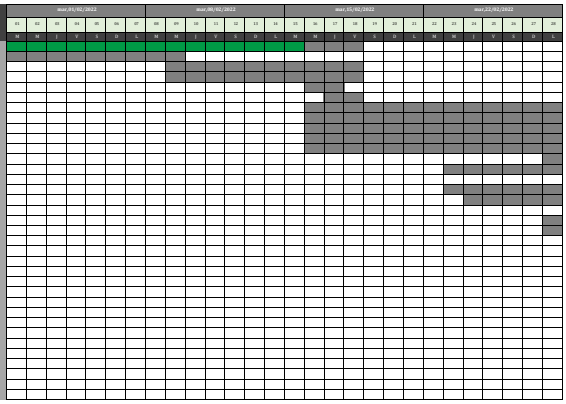
EDT	TAREA	PROGRESO	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS)	PREDECESORA	SUCESORA
1	DEFINIR	97%	01/02/2022	18/02/2022	17		
1.1	Crear equipo multidisplinario	100%	01/02/2022	09/02/2022	8		1.2
1.2	Identificar y/o validar las oportunidades de mejora	100%	09/02/2022	18/02/2022	9	1.1	1.4
1.4	Definir objectivos del proyecto	100%	09/02/2022	18/02/2022	9	1.2CC	
1.5	Definir metricas	100%	16/02/2022	17/02/2022	1	1.3CC	1.6
1.6	Determinar brecha	100%	17/02/2022	18/02/2022	1	1.5	
2	MEDIR	49%	16/02/2022	10/03/2022	22		
2.1	Recopilar datos (Procedimientos, datos y validar desde cuando se tienen)	50%	16/02/2022	08/03/2022	20	1.5	
2.2	Medir el desempeño actual del proceso	50%	16/02/2022	10/03/2022	22	1.5	
2.3	Determinar los parametros a medir (Indicadores de acopios y comercializadoras)	50%	16/02/2022	28/02/2022	12	2.2CC	
2.4	Desarrollar y validar sistema de medición	50%	16/02/2022	05/03/2022	17	2.2CC	
2.5	Crear un tablero con los nombres de las comercializadoras y sus resultados	50%	28/02/2022	10/03/2022	10	2.3	
3	ANALIZAR	0%	21/02/2022	21/03/2022	28		
3.2	Analizar cuales son las comercializadoras con mejor desempeño	0%	10/03/2022	11/03/2022	1	2.5	
3.3	Identificar las variables que afectan al proceso	0%	21/02/2022	21/03/2022	28	3.2	
3.4	Analizar las limitaciones y áreas de mejora de documentación actual	0%	24/02/2022	01/03/2022	7	3.3	
3.5	Identificar los acopiadores con mejores resultados en trabajo con comercializadoras	9%	10/03/2022	11/03/2022	1	3.2CC	
4	MEJORAR	0%	28/02/2022	04/07/2022	128		
4.01	Política con definición de bono acopiadores y forma de trabajo	0%	28/02/2022	14/03/2022	14		4.02
4.02	Gestionar la validación de política de forma de trabajo y bonos	0%	14/03/2022	22/03/2022	8	4.01	
4.03	Concientizar a acopiadores de nueva forma de trabajo	0%	22/03/2022	28/03/2022	6	4.01	
4.04	Creación de políticas sobre el nuevo modelo de trabajo	0%	03/03/2022	15/03/2022	12		
4.05	Definir fichas técnicas del modelo	0%	11/03/2022	24/03/2022	9		
4.06	Redacción del contrato con comercializadoras	0%	24/03/2022	10/04/2022	17		
4.07	Gestionar la validación del modelo	0%	10/04/2022	17/04/2022	7		4.01
4.08	Gestionar la validación del modelo con las comercializadoras seleccionadas	0%	17/04/2022	30/04/2022	13		
4.09	A Cont. Asignar comercializadoras a acopiadores	0%	30/04/2022	01/05/2022	1		
4.10	Trabajo de acopio con comercializadoras con el modelo	0%	30/04/2022	30/06/2022	61		
4.11	Firma de contrato y entrega de documentación a comercializadoras	0%	30/04/2022	06/05/2022	6		
4.12	Elaborar perfil de puesto de la persona encargada de compra de materia prima	0%	15/03/2022	24/03/2022	9		4.01
4.13	Gestionar la validación del puesto	0%	10/04/2022	17/04/2022	7		4.11
4.14	Contratar a la(s) persona(s) encargadas de compra de materia prima	0%	25/06/2022	04/07/2022	13		
5	CONTROLAR	0%	30/04/2022	30/09/2022	122		
5.1	Monitorear los KPI´s y logros de las comercializadoras	0%	30/04/2022	30/08/2022	122		
5.2	Realizar comparativa de resultados	0%	30/04/2022	30/08/2022	122
